


m u. GOK (218,04 m ü. NN)

218,0		
217,0	BK Z4 GP1:0,95-1,00	18,07
216,0	BK Z4 GP2:1,95-2,00	7,52
215,0	BK Z4 GP3:2,95-3,00	1,69
214,0	BK Z4 GP4:3,95-4,00	8,62
213,0	BK Z4 GP5:4,95-5,00	7,48
212,0	BK Z4 GP6:5,75-5,80	14,35
211,0	BK Z4 GP7:6,65-6,70	19,91
210,0	BK Z4 GP8:7,95-8,00	17,72
209,0	BK Z4 GP9:8,95-9,00	6,87
208,0	BK Z4 GP10:9,95-10,00	17,02
207,0	BK Z4 WP1:8,40-10,20	12,69
206,0	BK Z4 12:11,95-12,00	15,36
205,0	BK Z4 13:12,95-13,00	9,13
204,0	BK Z4 14:13,95-14,00	13,79
203,0	BK Z4 15:14,95-15,00	
202,0	BK Z4 16:15,95-16,00	9,42
201,0	BK Z4 17:16,75-16,80	
200,0	BK Z4 18:17,95-18,00	
199,0	BK Z4 19:18,95-19,00	
	BK Z4 20:19,95-20,00	
	BK Z4 WP3:17,45-20,00	

218,04	Auffüllung, Beton
217,74	Auesand
216,04	Neckarkies
211,84	Fließerde
209,64	Zellenkalk, Travertin
207,84	Grüne Mergel
204,04	Lingula Dolomit
201,19	Obere Graue Mergel
200,69	Anoplophora Dolomit
198,39	Untere Graue Mergel
198,04	

BK Z 4

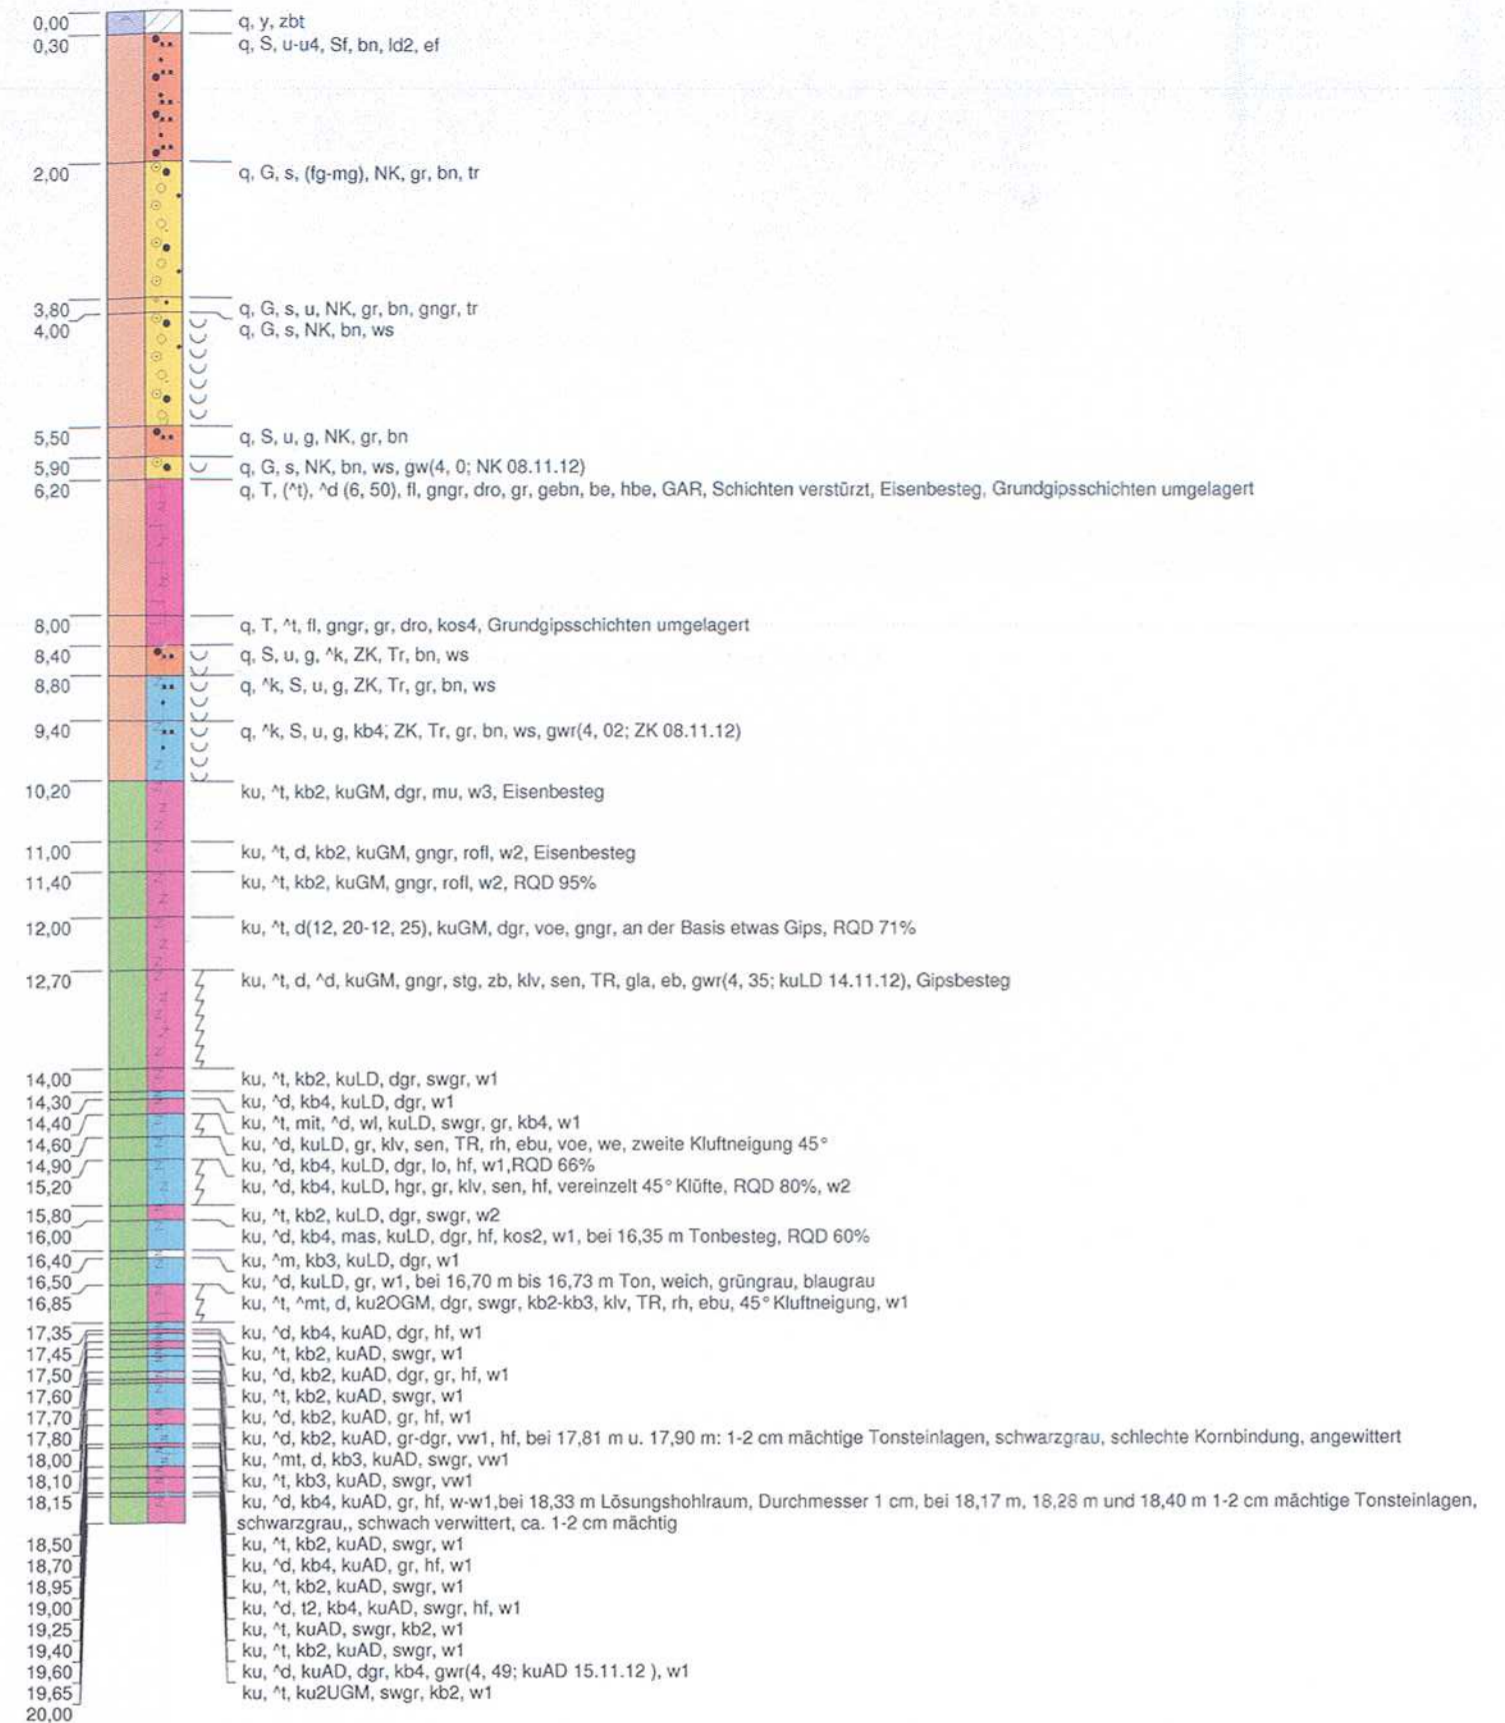

Höhenmaßstab: 1:100

Blatt 1 von 1

Projekt:	EÜ Neckar, Projekt Nr. 74454	
Bohrung:	BK Z 4	
Auftraggeber:	DB Projekt Bau	Rechtswert: 3515383,51
Bohrfirma:	Terrasond	Hochwert: 5407195,83
Bearbeiter:	Elsche	Ansatzhöhe: 218,04m
Datum:	16.11.2012	Anlage: 4.4.1

